

Готовый чек-лист технического состояния и эксплуатации АЗС/АГЗС




Доступно в RETAILQA™

8 800 250 33 28

<https://rtlq.ru>

info@retailqa.ru

Используйте электронный чек-лист технического состояния и эксплуатации АЗС / АГЗС в системе мобильного аудита RETAILQA

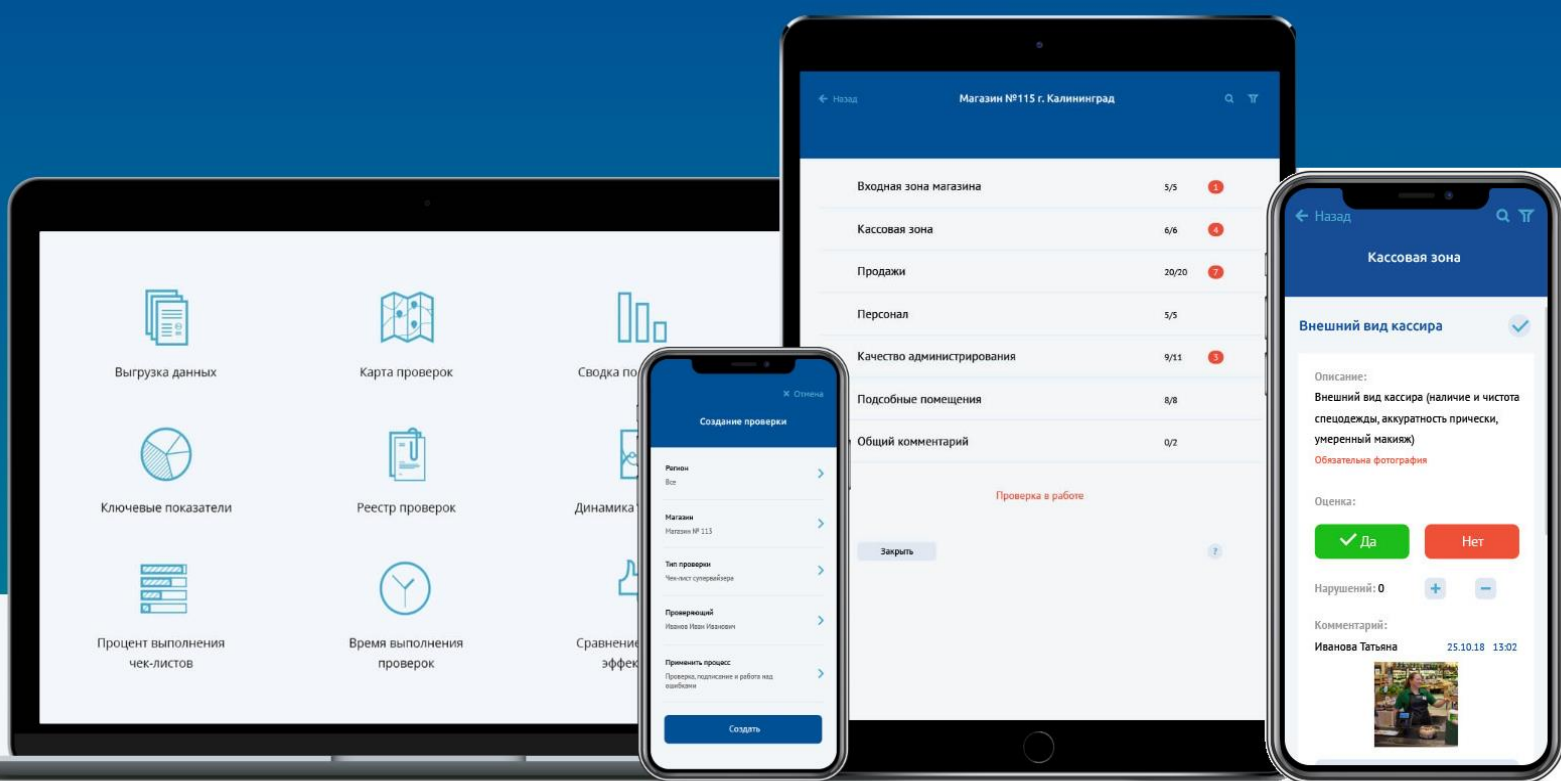

Преимущества использования

Удобно

- ✓ 10 типов оценок
- ✓ Конструктор чек-листов
- ✓ Система весов и баллов
- ✓ Web-отчеты для руководства
- ✓ Акции и фотоотчеты
- ✓ Push и email уведомления
- ✓ Контроль по геолокации
- ✓ Образцы и фото примеры
- ✓ Файловые вложения
- ✓ Аудио и видеозаписи
- ✓ Повторный контроль нарушений
- ✓ Ограничение прав пользователей
- ✓ Свой смартфон или планшет
- ✓ Поддержка iOS и Android
- ✓ Автономный режим работы

Выгодно

- ✓ Защита от надзорных органов
- ✓ Минимизация штрафов
- ✓ Сокращение потерь
- ✓ Экономия ФОТ
- ✓ Контроль регламентов и стандартов
- ✓ Адаптация персонала
- ✓ Внедрение системы мотивации
- ✓ Доступ для тайных покупателей
- ✓ Выделенный личный кабинет
- ✓ Месяц бесплатно
- ✓ Настройка «под ключ»
- ✓ Доработки под Клиента
- ✓ Интеграция со сторонним ПО
- ✓ Брендинг интерфейса
- ✓ Новые модули и функционал

Эффективно

- ✓ Замена бумаги и мессенджеров
- ✓ Ускорение сбора данных
- ✓ Снижение временных затрат
- ✓ Повышение качества работы
- ✓ Проверки, задачи, планирование
- ✓ Претензии
- ✓ Работа над ошибками
- ✓ Выявление неочевидных проблем
- ✓ Быстрая обратная связь
- ✓ Подключение сервисных служб
- ✓ Сценарии и процессы проверок
- ✓ Облачное хранение данных
- ✓ Доступ к данным по API
- ✓ Успешные кейсы внедрений
- ✓ Экспертиза по аудитам

ЗАПОЛНЯЕТСЯ АУДИТОРОМ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОВЕРКИ

Объект проверки:	
Адрес:	
Дата проверки:	
Время начала проверки:	
Дата предыдущей проверки:	
Объект посещен по геолокации*:	
Проверяющий/Аудитор:	
Куратор/Супервайзер:	
Управляющий:	
Сотрудники на смене:	
Примечание:	

*Доступно в RETAILQA

ЗАПОЛНЯЕТСЯ АУДИТОРОМ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Дата завершения проверки:	
Время завершения проверки:	
Длительность проверки:	
Выявлено нарушений:	
Поставлено задач:	
Общий % выполнения чек-листа*:	
Общая сумма штрафа*:	
Замечания:	
С результатом ознакомлены (ФИО, должность, подпись):	

*Доступно в RETAILQA

АЗС / ТРК

Критерий	Оценка	Комментарий	Срок устранения
ТРК и заправочные островки чистые	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Дисплеи топливораздаточных колонок в рабочем состоянии	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Техническое состояние дыхательных клапанов в норме	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Нет следов подтекания топлива	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Целостность и рабочее состояние муфт, пистолетов, фиксаторов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Нет отрывов пистолетов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
При осмотре не выявлено следов "самопального" ремонта <i>Акцентируем внимание на починку отрыва пистолета</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Состояние шлангов ТРК <i>Шланги в хорошем состоянии. Нет изломов, трещин, утечек, люфтов м/у шлангом и фитингами</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Жидкости в дренажных колодцах отсутствуют	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Хорошее состояние окраски металлоконструкций	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Выполнена зачеканка всех кабель-каналов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Электропровода защищены и скрыты	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Пожарное оборудование в 100% комплектации <i>Огнетушители, пожарный щит, достаточное кол-во песка</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

СОСТОЯНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ

Критерий	Оценка	Комментарий	Срок устранения
Протечек топлива при проверке не обнаружено	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Не выявлено признаков загазованности в шахте	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

В шахте нет следов воды / прочих остатков нефтепродуктов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Электропровода защищены и скрыты	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Выполнена зачеканка всех кабель-каналов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Исправность запорно-регулирующей арматуры <i>Задвижки, шаровые краны, ЭМК</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Исправность ограничителей, люков и газовых амортизаторов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Установлены необходимые таблички и указатели	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Хорошее состояние окраски металлоконструкций, исправность запорных элементов ЖМТ-ящика	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

ЖМТ / ЗОНА СЛИВА

Критерий	Оценка	Комментарий	Срок устранения
Не выявлены дефекты и нарушения на площадке слива ЖМТ <i>Обратить внимание на состояние окраски металлоконструкций, исправность запорных элементов ЖМТ-ящика</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Исправность устройства заземления автоцистерн (УЗА, ЖМТ)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Не обнаружены засоры в ливневке	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Нет видимых повреждений отмостки	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Дыхательная система в рабочем состоянии	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Манометры в наличии	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Пожарное оборудование в 100% комплектации <i>Огнетушители, пожарный щит, достаточное кол-во песка</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

ЖМТ / ЯЩИК СЛИВА

Критерий	Оценка	Комментарий	Срок устранения
Не выявлено признаков загазованности в шахте	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Состояние кранов системы рециркуляции паров <i>Исправны, закрыты, целостность рукояток</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Переключки фланцевых соединений	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Выполнена зачеканка всех кабель-каналов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Электропровода защищены и скрыты	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Не выявлено нарушений герметичности трубопроводов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

АГЗС / ОБЩЕЕ

Критерий	Оценка	Комментарий	Срок устранения
Нет видимых повреждений отмостки	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Не выявлены дефекты и нарушения на площадке слива АГЗС	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Не выявлены дефекты и нарушения на площадке слива АГЗС <i>Дополнительный контроль окраски всех металлоконструкций</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Отсутствуют повреждения противопожарного ограждения	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Отсутствуют повреждения теплоизоляционной защиты	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Не выявлено нарушений в технологической системе СУГ	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Исправность УЗА на СУГ	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Исправность системы контроля концентрации паров СУГ	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

Не выявлено отклонений и неисправностей во время проверки КИПиА	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Исправность электромагнитных клапанов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Исправность аварийного останова	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Электрооборудование заземлено	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Исправность системы детекции огня	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Пожарное оборудование в 100% комплектации	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

АГЗС / Сосуды, ТС

Критерий	Оценка	Комментарий	Срок устранения
Предупреждающие знаки и информационные таблички установлены	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Отсутствуют визуальные дефекты и повреждения <i>(вмятины, заломы, трещины и т.д.)</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Исправность сосудов и подставок под них <i>Выполнено заанкеривание</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Исправность теплоизоляции	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Исправность предохранительной и запорной арматуры	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Исправность насосного и компрессорного оборудования	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Муфты насосов закрыты защитными кожухами	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Исправность манометров на сосудах и технологической системе	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Отсутствуют замечания по общему состоянию площадки слива СУГ	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Полная обеспеченность средствами пожаротушения	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

--	--	--	--

АГЗС / ГРК

Критерий	Оценка	Комментарий	Срок устранения
Корпус ГРК целый, без повреждений	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Островки ГРК в хорошем состоянии	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Дисплеи газораздаточных колонок в рабочем состоянии <i>Не разбиты, не испачканы, уровень подсветки достаточный</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Нет ошибок при контроле срабатывания блокировок <i>(загазованность, давление, аварийный останов)</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Исправное состояние возвратного механизма на ГРК <i>Контроль на отрыв рукава</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Целостность и рабочее состояние муфт, pistolsов, фиксаторов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Хорошее состояние шлангов ГРК <i>Нет изломов, трещин, утечек, люфтов м/у шлангом и фитингами</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Нет признаков подтекания СУГ	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Не выявлено отклонений в показаниях весовых колонок	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Нет нарушений в технологической системе газа	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Все шаровые краны и насосы в рабочем состоянии	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Весы для заправки бытовых баллонов исправны, в рабочем состоянии	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

ЩИТ АВТОМАТИКИ

Критерий	Оценка	Комментарий	Срок устранения
Щит автоматики в рабочем состоянии	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Инструкция доступна, контактные телефоны ответственных обозначены	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

ЭЛЕКТРИКА, ОБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ НА АЗС/АГЗС

Критерий	Оценка	Комментарий	Срок устранения
В электрощитовой порядок, нарушений не выявлено	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Исправность УЗА	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Освещение на территории в исправном состоянии	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Отсутствие неисправностей подсветки стеллы	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Отсутствие неисправностей подсветки здания	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Отсутствие неисправностей на лайтбоксах	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Автоматы, выключатели, розетки исправны	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Теплозавесы, потолочные обогреватели, конвекторы в рабочем состоянии	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНСТРУКТАЖ НА АЗС

Критерий	Оценка	Комментарий	Срок устранения
Контроль наличия, корректности и своевременности заполнения всех журналов и инструктажей <i>В комментариях прописать выявленные нарушения</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Управляющим АЗС пройден и усвоен положенный инструктаж по ОТ / ПБ / ППБ <i>Выборочная проверка знаний</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Старшими операторами АЗС пройден и усвоен положенный инструктаж по ОТ / ПБ <i>Выборочная проверка знаний</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Линейными операторами АЗС пройден и усвоен положенный инструктаж по ОТ / ПБ <i>Выборочная проверка знаний</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Заправщиками АЗС пройден и усвоен положенный инструктаж по ОТ / ПБ / ППБ <i>Выборочная проверка знаний</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

ПРИМЕЧАНИЕ

Прочие примечания и замечания проверяющего
